

नमस्कार

जिल्ला विकास समिति, तनहु

# वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी

(आ.व. २०७२/७३)

प्रस्तुतकर्ता  
हरि दत पौडेल

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय  
तनहु

२०७३ श्रावण २५ गते

# खानेपानी तथा सरसफाईको अधाविधक स्थिति



ग.वि.स। न.पा. संख्या: ३७/५


जिल्लाको जनसङ्ख्या  
(२०७२): ३२३२८८

जिल्लाको घर धुरी सङ्ख्या: ७८२८६  
खानेपानीको कभरेज प्रतिशतमा : ८४.०७


सरसफाईको कभरेज प्रतिशतमा : १००

# जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाईको अद्यावधिक स्थिति

खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित  
जनसङ्ख्या

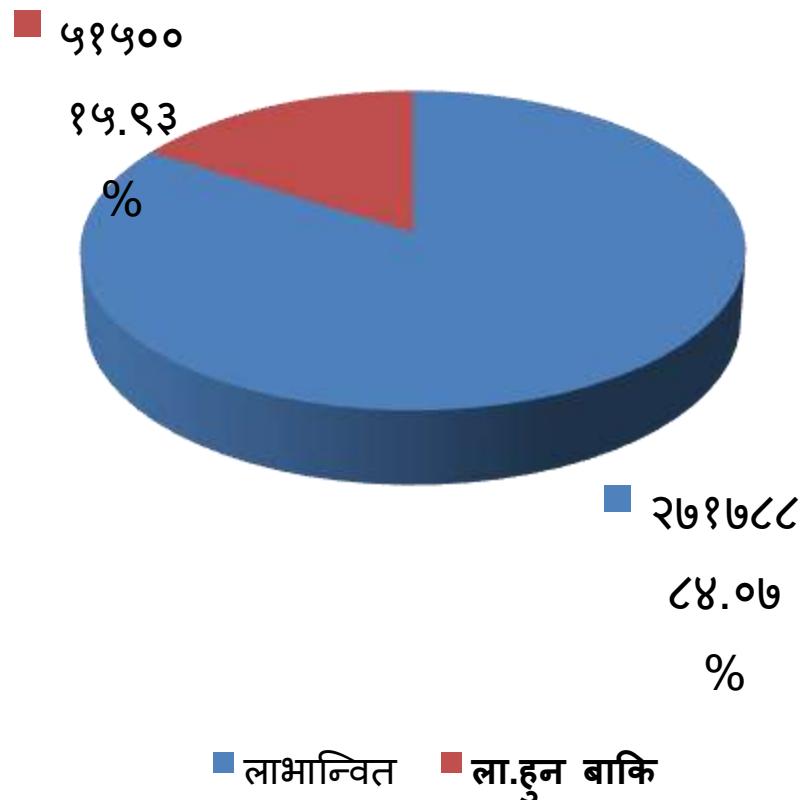

सरसफाई सुविधा प्राप्त घरधुरी सङ्ख्या

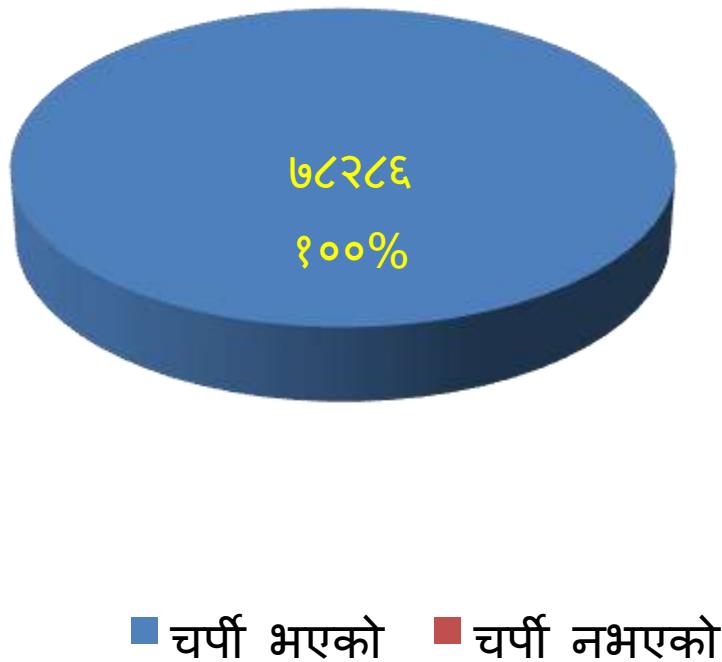


सि.नं.	व.उ.सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	पुर्व विनियोजित	थप	जम्मा	खर्च	खर्च प्रतिशत
क.सं.	पुँजीगत तर्फ						
१	३४७१६६४	वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम	१५२०	१७००	३२२०	२२५८	७०.१२
२	३४७१६८४	खानेपानी पुर्नस्थापना आयोजना	३२००	५७००	८९००	८९००	१००.००
३	३४७१७१४	खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना	१६६२०	६०००	२२६२०	१४७५४	६५.२३
४	३४७१७५४	वर्षातको पानी संकलन आयोजना	११००		११००	१०७५	९७.७३
५	३४७८०२४	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	६३२४५	३११००	९४३४५	८८७०५	९४.०२
६	३४७८०५४	क्रमागत ठुला आयोजनाहरू			०		
७	३४७८१८४	खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम			०		
८	६०२८०१४	भुकम्प प्रभावित खानेपानी आयोजनाको पुनर्स्था	१११७८		१११७८	१०७५०	९६.१७
९	३४७१७९४	दोश्रो साना शहरी खा.पा.आयोजना	६४४९२		६४४९२	४४१६०	६८.४७
१०	३४७१६९४	डिप ट्रूबेल आयोजना	१०००		१०००	१०००	१००
जम्मा			१६२३५५	४४५००	२०६८५५	१७१६०२	
ख.	चालुतर्फ						
१	३४७८०२३	खानेपानी आयोजनाहरू	८६८६		८६८६	७६०५	८७.५५
२	३४७१६७३	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन	६९		६९	६९	१००
३	३४७१६६३	वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम	१०००		१०००	८२९	८२.९
४	अन्य						
	जम्मा		९७५५	०	९७५५	८५०३	
	कुल जम्मा(क+ख)		१७२११०	४४५००	२१६६१०	१८०१०५	८३.२५

# कार्यक्रमगत वार्षिक पुँजीगत बजेट र खर्चको स्थिति


रकम रु हजारमा

कूल बजेट २१६६१० , कूल खर्च १८०९०५

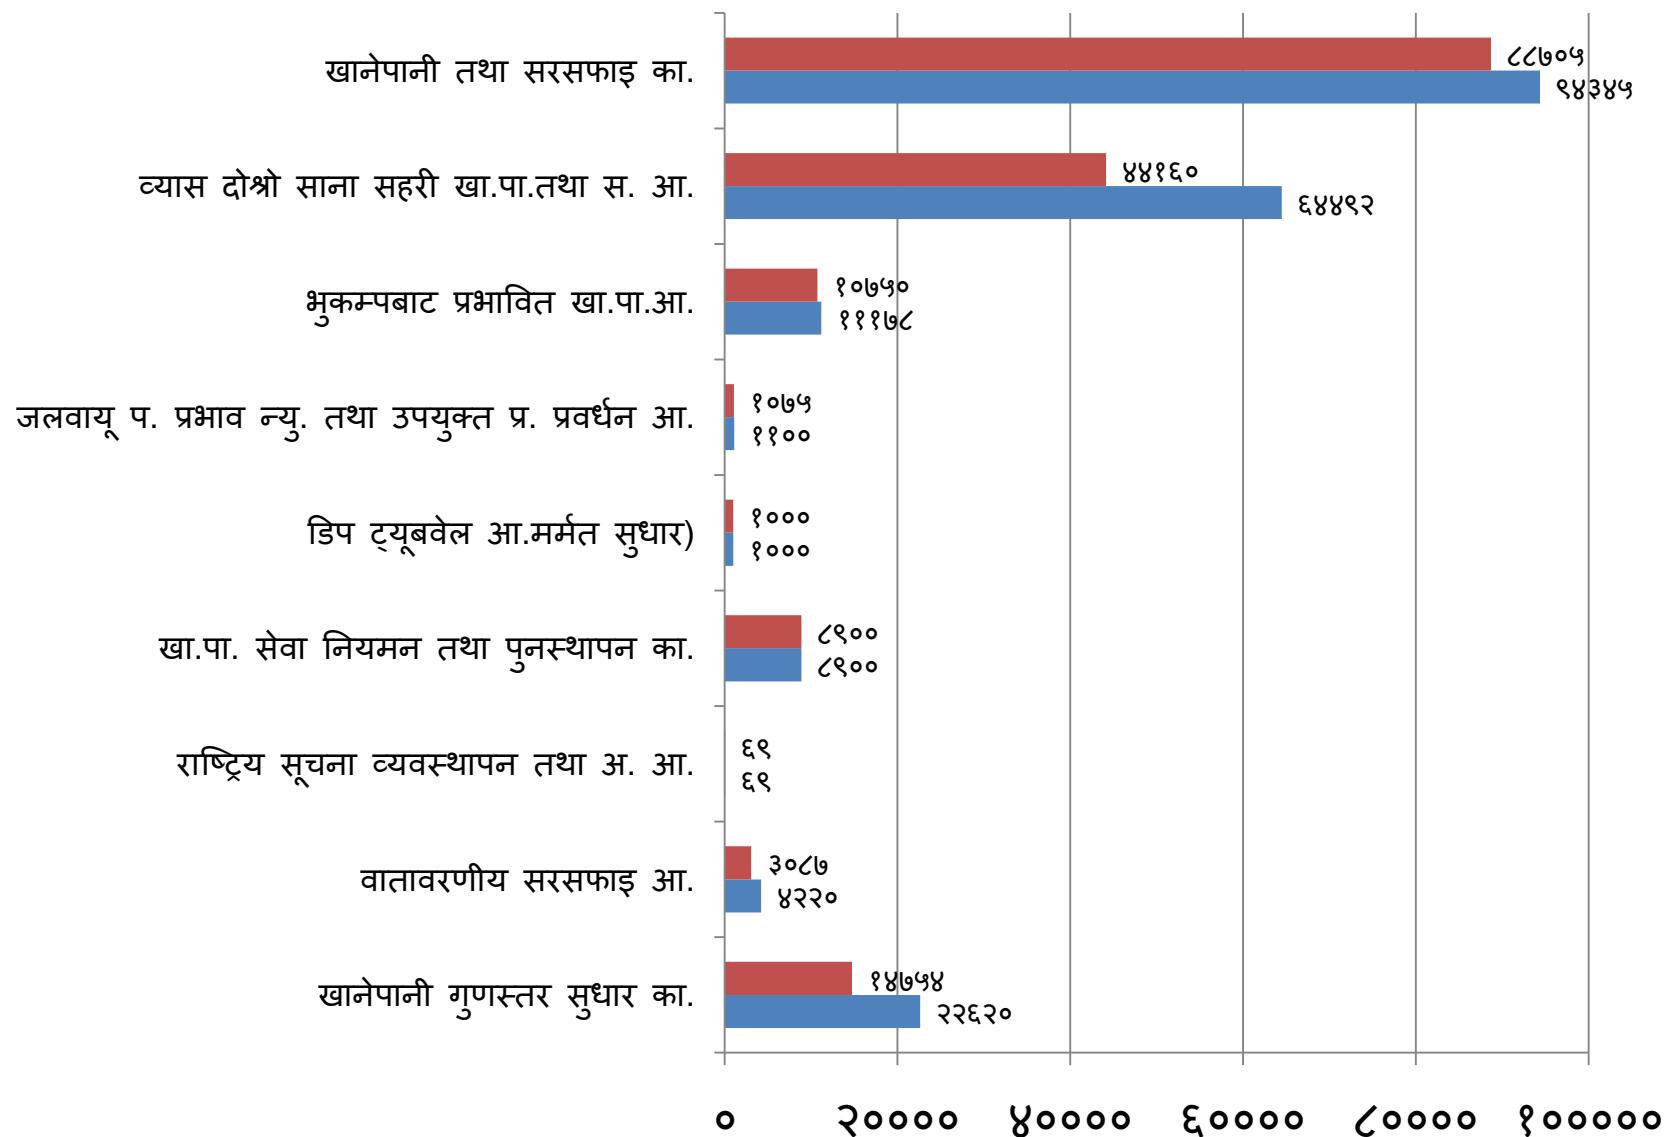

# तुलनात्मक भौतिक तथा वित्तीय वार्षिक प्रगति प्रतिशत

कुल भौतिक प्रगति प्रतिशत: ८८.३९  
कुल वित्तीय प्रगति प्रतिशत:  
८३.१५

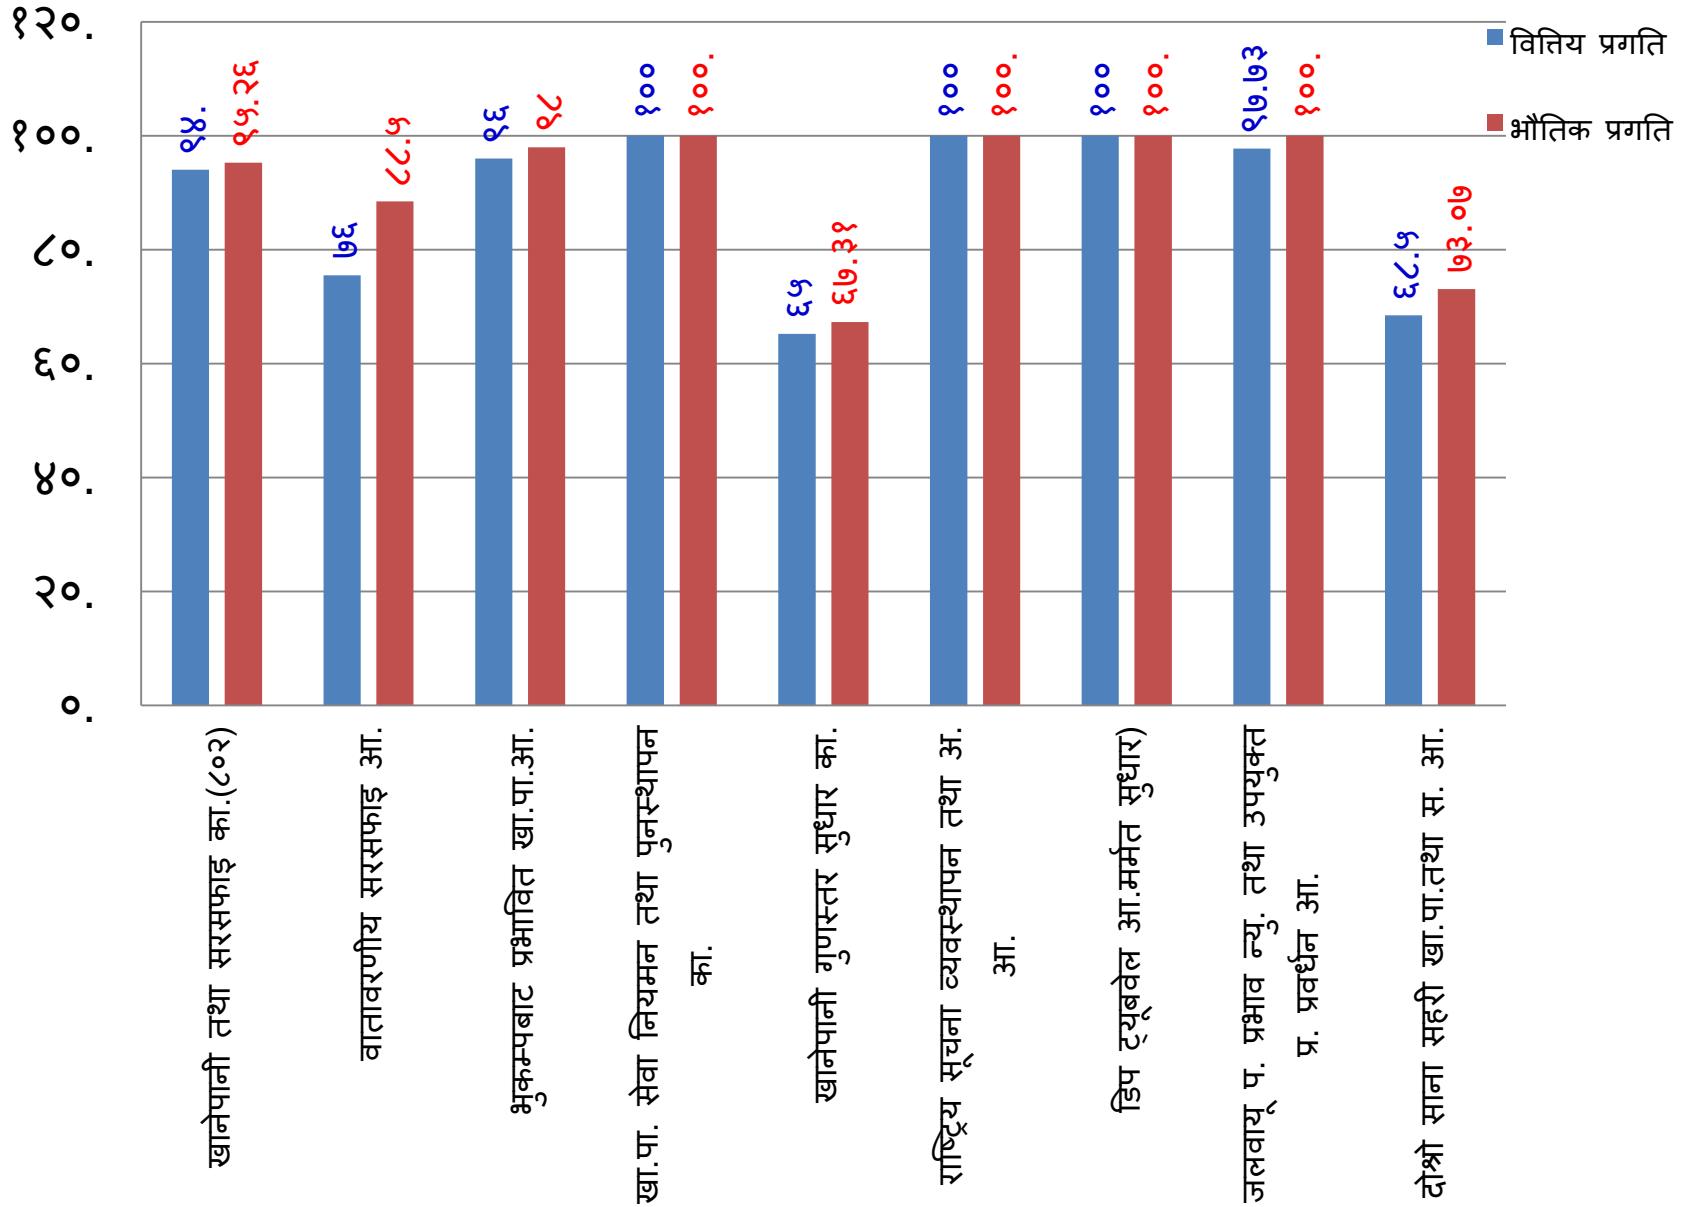

आ.व. २०७२/७३मा सम्पन्न आयोजना, स्किम /लाभान्वित  
जनसङ्ख्या

ब.उ.शी. न	कार्यक्रम/ आयोजना	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
३४७८०२	सम्पन्न खा.पा. तथा स. आयोजना संख्या	४	४	
	सम्पन्न खा.पा.आ. (सेवा अभिवृद्धि,) बाट आ.व २०७२/७३ मा थप लाभान्वित जनसङ्ख्या	२५५४	२५५४	
	क्रमागत आयोजनाको सम्पन्न स्किम बाट लाभान्वित जनसङ्ख्या	१२५०	१२५०	
	सम्पन्न खा.पा.आ. (लक्षित सेवामा सेवा पुनर्स्थापन, सेवा स्तरोन्नती -ब.उ.शी.न ३४७८०२ ) बाट लाभान्वित जनसङ्ख्या()	५५२७	५५२७	
	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमबाट सञ्चालित क्रमागत तथा सम्पन्न आयोजनाहरूबाट कूल लाभान्वित सङ्ख्या	९३३१	९३३१	
३४७८०५	सम्पन्न उच्च तथा मध्यम. स्तरीय ठूला खा.पा.आ			
	लाभान्वित जनसङ्ख्या	९३३१	९३३१	

# खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम (३४७८०२ र ३४७८०५) प्रतिफल सूचकको प्रगति

विवरण	ईकाइ	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
पाइप उपलब्धी	कि.मी.	९१.४९	९७.५	१००
इन्टेक निर्माण	गोटा	२४	२२	९६
पाइप लाइन जडान	कि.मी.	११६.५९	११२.५	९६
पानीपोखरी निर्माण	गोटा	२६.७५	२६	९७
धारा निर्माण निजी	गोटा	१९०	१९०	१००
धारा निर्माण सार्वजनिक	गोटा	१८	१८	१००
आयोजना हस्तान्तरण	गोटा	४	०	०
क्रमागत आयोजनाको स्किम हस्तान्तरण	गोटा	२	२	१००

ल. ई. को अद्यावधिक (खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, उच्च तथा मध्यम स्तरीय ठूला खा.पा.आ. हरू,)

विवरण	
जिल्लामा सञ्चालित कूल आयोजना सङ्ख्या (सालवासाली बाहेक) क) क्रमागत ३२ ख) नयाँ १२	४४
ल.इ. तयार भएको आयोजना सङ्ख्या	४४
ल.इ. स्विकृत सङ्ख्या क) क्रमागत ३२ ख) नयाँ १२	३२
ल.इ. स्वीकृत हुन बाँकी आयोजना	१२

# क्षमता विकास सम्बन्धी प्रतिफल सूचकको प्रगति

सि. न	तालिमको विवरण	लक्ष्य	प्रगति
१	यस आवमा खानेपानी आयोजना सम्बन्धी तालिम प्राप्त उपभोक्ता समिति सङ्ख्या (निर्माण पूर्व/ पश्चात्/ मर्मत सम्भार आदी)	२१	२१
	सो तालिमहरूबाट तालिम प्राप्त सदस्य/ पदाधिकारी/उपभोक्ता सङ्ख्या	७४	७४
२	खानेपानी सुरक्षा योजना (WSP) सम्बन्धी तालिम प्राप्त उ.स. सङ्ख्या	३	३
	तालिम प्राप्त सदस्य/ पदाधिकारी/उपभोक्ता सङ्ख्या	३९	३९
३	सरसफाइ सम्बन्धी अभिमुखिकरण भएको सङ्ख्या	१०	१०
	अभिमुखी कृत उपभोक्ता सङ्ख्या	४९२	४९२
४	अन्य तालिमबाट लाभान्वित उपभोक्ता सङ्ख्या	१२	५
	कूल जम्मा तालिम प्राप्त सदस्य/ पदाधिकारी/उपभोक्ता सङ्ख्या	६३८	६३१

व.उ.शि.नं. ३४७१६६, वातावरणीय सरसफाइ आयोजना को प्रगति, चालू आ.व.०७२/७३को

सि न	विवरण	प्रगति  परिमाण
१	कूल गा.वि.स. /न.पा. सङ्ख्या (समायोजन भए अनुसारको)	३७ / ५
२	गठित V/M WASHCC	३७ / ५
३	गठन हुन बाँकी V/M WASHCC	
४	DWASHCC कूल बैठक सङ्ख्या आ.व.०७२/७३मा	५
५	Post ODF Plan बनेको/नबनेको	बनेको
६	जिल्ला ODF को अवस्था	१००%
७	चालू आ.व.०७२/७३ मा लक्षित ODF सङ्ख्या गा.वि.स. / न.पा. सङ्ख्या	
८	चालू आ.व.मा ODF घोषित गा.बि.स/ न.पा. सङ्ख्या	
९	चालू आ.व. मा ODF घोषित घर धुरी सङ्ख्या	
१०	चालू आ.व.सम्ममा ODF घोषित गा.बि.स र न.पा. सङ्ख्या	१००%
११	चालू आ.व.मा सम्पन्न संस्थागत चर्पी संख्या	१
१२	चालू आ.व.मा सम्पन्न सार्वजनिक चर्पी संख्या	५
१३	चालू आ.व.०७२/७३ सम्म बनेको सार्वजनिक चर्पी सङ्ख्या	२६


## आ.व. ०७२/७३ मा चर्पी निर्माणमा सरोकारवालाहरूको योगदान, जम्मा निर्मित चर्पी सङ्ख्या



- खा.पा. तथा सरसफाइ कार्यक्रम र उच्च तथा म.स्त. ठूला खापाआ बाट
- वातावरणीय सरसफाइ आ.वाट
- गा.वि.स., जि.वि.स., गै.स.स.
- , स्वयम् घरधुरीबाट

# सरसफाइको कभरेज

Sanitation Coverage %

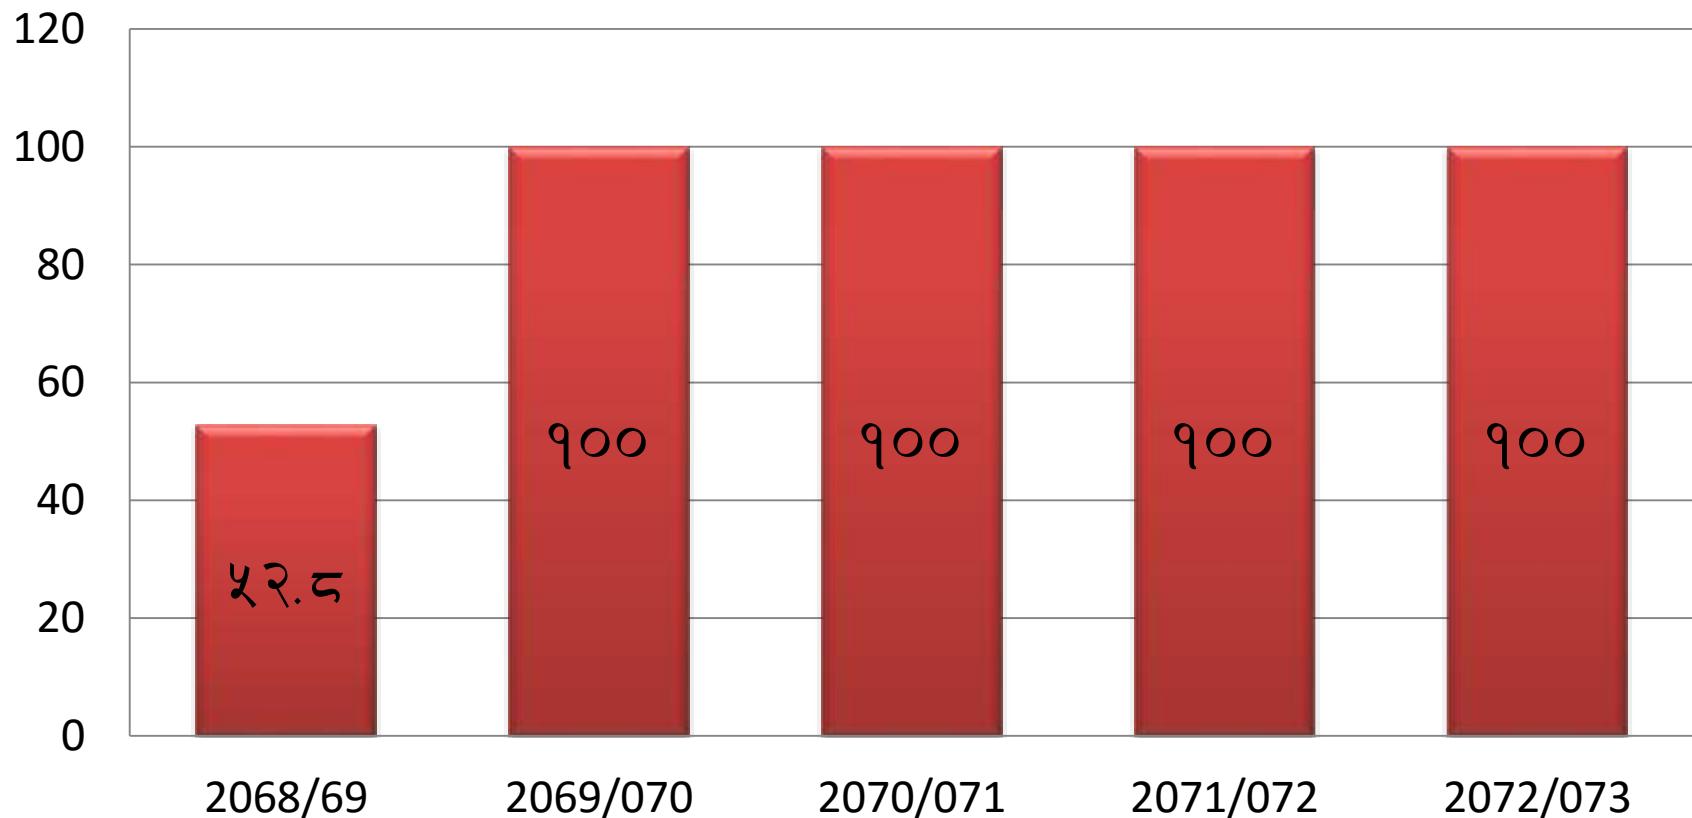

## व.उ.शि.नं. :- ३४७१७९ खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना को प्रगति

विवरण	उपलब्धि
आ.व ०७२/७३ मा सम्पन्न आयोजना सङ्ख्या/ स्किम सङ्ख्या/लाभान्वित जनसङ्ख्या:	४/२/९३३१
क्रमागत आयोजना सङ्ख्या:३	सञ्चालन मा रहेको
हाल सम्म जिल्लामा सम्पन्न आयोजना सङ्ख्या र लाभान्वित जनसङ्ख्या	१४८६/२७१७७६
खानेपानी सुरक्षा योजना लागू भएको आयोजना सङ्ख्या र लाभान्वित जनसङ्ख्या आ.व. ०७२/७३	३/१५६०
हाल सम्म जिल्लामा सम्पन्न WSP सङ्ख्या र लाभान्वित जनसङ्ख्या	१६/५६७४०
Wagtech /Delagua Kit को अवस्था सङ्ख्या:	१ रामरो
खानेपानी गुणस्तर परीक्षण भएका आयोजना सङ्ख्या	
सम्पन्न आर्सेनिक सुरक्षित ट्यूववेल सङ्ख्या:	०
आर्सेनिक न्यूनिकरण कार्यक्रमबाट लाभान्वित जन सङ्ख्या:	०

व.उ.शि.नं. :- ३४७९६८ खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रमको  
प्रगति

विवरण	उपलब्धि
जिल्लामा मर्मत पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने पहिचान भएको आयोजना/ स्किम सङ्ख्या	५८०
Detail Estimate तयार भएको सङ्ख्या	२०
स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आ.व.०७२/ ७३ मा मर्मत पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने लक्षित आयोजना / स्किम सङ्ख्या २२	
आ.व.०७२/ ७३ मा मर्मत पुनर्स्थापन भएको आयोजना/ स्किम सङ्ख्या	२२
सुरुदेखि हाल सम्म मर्मत पुनर्स्थापन भएको आयोजना/ स्किम सङ्ख्या	६५
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजना / स्किम मर्मत भएको सङ्ख्या (लक्ष्य/उपलब्धी)	१२५/३१/१४५७३ ला.
मर्मत पुनर्स्थापनबाट लाभान्वित जनसंख्या	२५९७७
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणबाट लाभान्वित जनसंख्या	१४५७३

जलवायु अनुकूलन/ डिप ट्यूबवेल / ढल निर्माण/ सहलगानी/सुख्खा क्षेत्र/साना  
सहरी खा.पा. कार्यक्रम/ आयोजनाहरूको उपलब्धि हरू


विवरण	प्रतिफल/उपलब्धि( सम्पन्न संरचनाहरू, लाभान्वित जनसङ्ख्या)
जलवायु अनुकूलन	२ आ. सम्पन ,६४९ जना लावानवित
डिप ट्यूबवेल	७०%
यास साना सहरी खा.पा	९५ %

# कार्यरत कर्मचारी विवरण

सि.नं.	विवरण	कूल स्विकृत दरबन्दी संख्या	पदपुर्ति संख्या	रिक्त
क)	स्थायी	२५	२१	६
ख)	फाजिल	३	१	
ग)	अस्थायी	२	२	
जम्मा ३१				
घ) दरबन्दी बाहेक सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारी संख्या: १				

# कार्यरत कर्मचारी विवरण

## दरबन्दी : पदपूर्तिको स्थिति

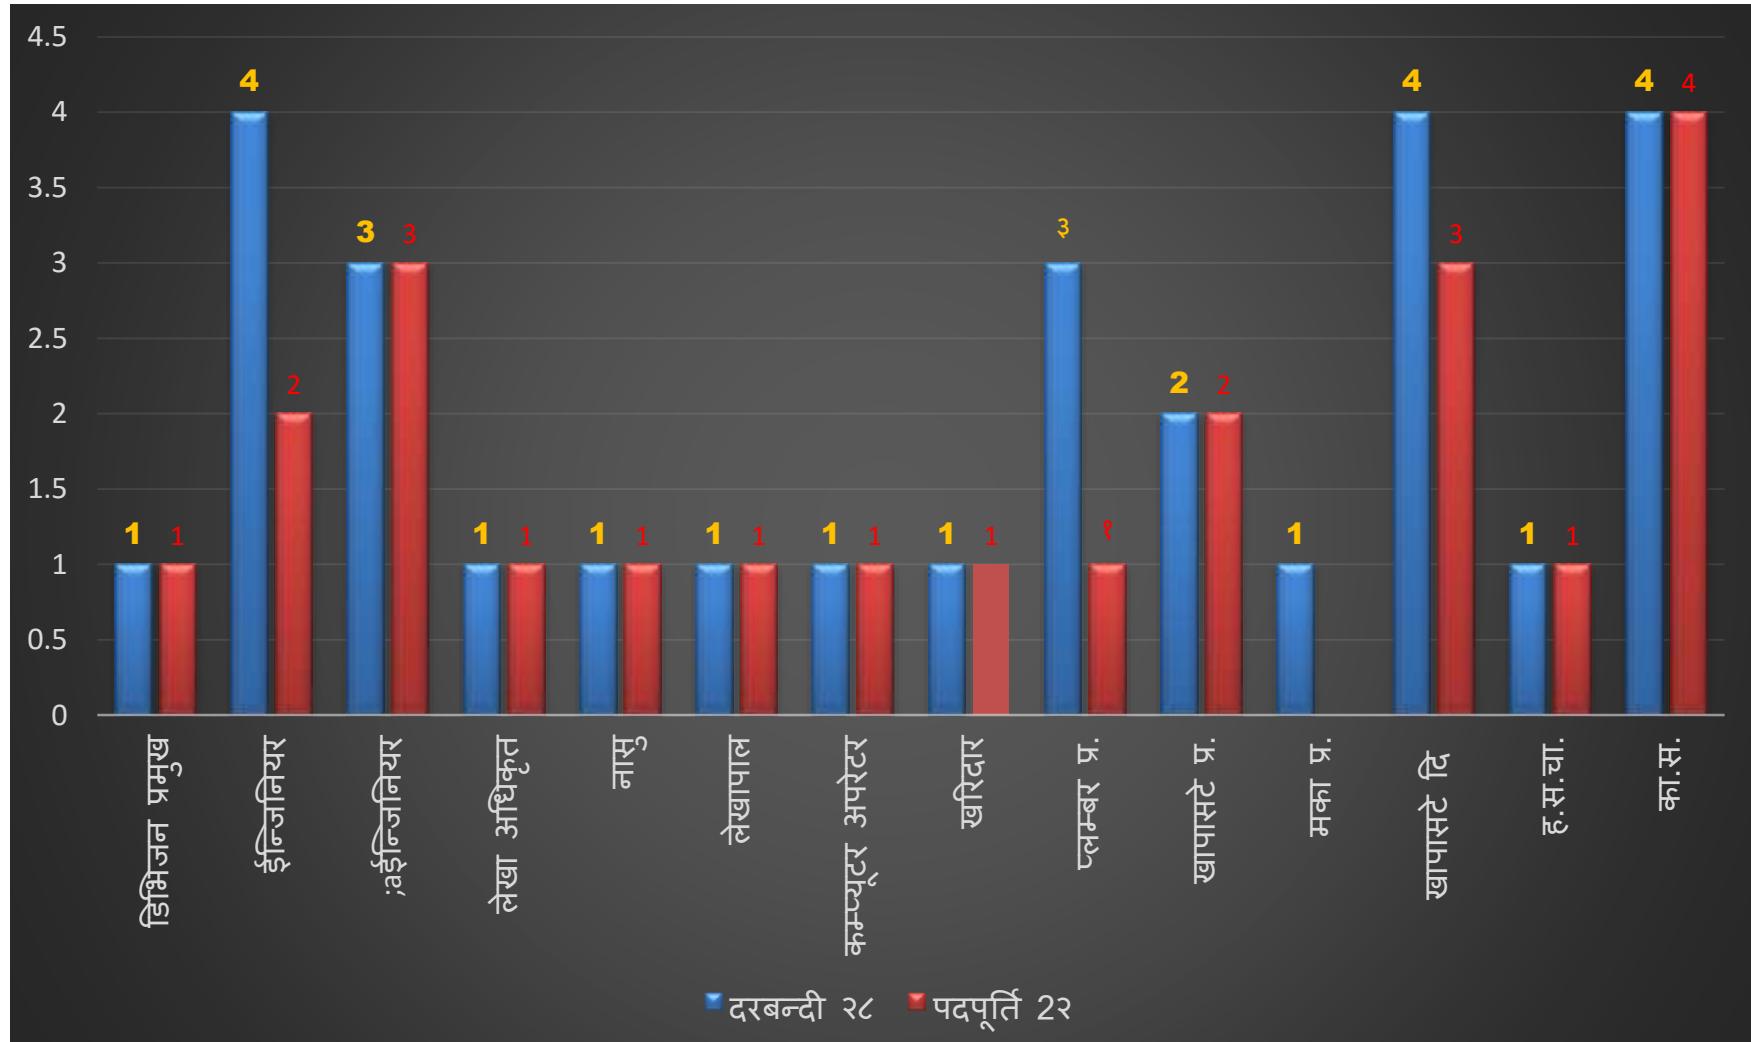

# मौजदात सवारी साधनको स्थिति

विवरण	संख्या	अवस्था			कैफियत
		चालु	मर्मत गरी सञ्चालन हुने	लिलाम बिक्रि गर्नु पर्ने	
गाडी	१	१			२४ बषे पुरानो
मोटरसाइकल	३	२		१	

यस आ.व. मा लिलाम बिक्रि गरेको

क) गाडी संख्या:

ख) मोटरसाइकल संख्या:

# बेरुजूको स्थिति

आ.व २०७०/७१ कूल बेरुजू	यस आ.व.मा फर्छयौट	फर्छयौट प्रतिशत	०७०/७१ सम्मको बाँकी	आ.व. ०७१/७२ मा थप	जम्मा बक्यौता बेरुजू
२२४७२३९८.५०	२०१९३३०८.४६	८९.८६	२२७९०९०.०४	१५६५२६६९१.१२	१६८५९१९७.५२

# उल्लेखनीय रचनात्मक तथा भुकम्प प्रभाव न्यूनिकरण कार्यहरू

## उल्लेखनीय रचनात्मक कार्यहरू

► जिल्लाभरीनै गुणस्तरयुक्त खानेपानी र सरसफाइको माग बढाइएको

► पुर्णसरसफाइको क्रियाकलापहरु जिल्लाभरीनै अगाडी बढाइएको

भुकम्प प्रभावित आयोजनाबाट सेवा सुचारू गर्ने गरिएको उल्लेखनिय प्रयासहरू

३१ आयोजना १४५७३ जनसंख्या

१२५ आयोजना पाहिचान भयको

# मुख्य समस्या तथा सुलभ

## कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू

- ग्रमिण पम्पिङ योजनाहरूमा विद्युत जडान तथा महसुल महंगो भएको, २० % जनश्रम बढी भएको
- Pumping Scheme को लागि कार्यालयमा दक्ष प्राविधिक को अभाव ( Electro Mechanical )
- ठूला आयोजनाहरूमा उ.स.को व्यवस्थापकिय प्राविधिक क्षमतामा कमी
- सम्पन्न आयोजनाको संख्या धेरै (१५००) भएकोले मर्मत संभारको माग बढि, श्रोत र जनशक्ति कमी
- खानेपानीका श्रोत सुक्नु, मुहान बिबाद
- कार्यालय भबनको असुविधा

## समस्या समाधानतर्फ भएका प्रयासहरू

- विभाग तथा विभिन्न निकायमा जानाकारी गराएको ।
- Out-sourcing गरी कार्य गरीएको
- Electrical/ Mechanical Sub-Engineer को दरबन्दी माग गरीएको
- तालीम गराइ क्षमताअभिवृद्धि गराइएको
- जिल्ला जलश्रोत समिति मार्फत समाधान प्रयत्न गरेको



पानी प्रसोधन केन्द्र को काम गरदै



A photograph showing the construction of a large, circular concrete water tank. The tank is partially completed, with its inner walls and floor already cast and reinforced with a dense grid of vertical and horizontal steel bars (rebar). The outer formwork is visible, supported by wooden poles. The ground around the tank is dirt, with some scattered debris, wooden shoring, and a white cloth. In the background, there's a small red-roofed building, some trees, and a dirt road. The sky is clear and blue.

पानी पोखरी को काम गर्द

भुकम्प बाट क्षतिग्रस्त पानी टंकी

मर्मत पुनर्स्थापन हुदै





# सरसफाइ सप्ताह



# पुर्ण सरसफाइमा ऐक्यबद्धता, पृथ्वी राजमार्गमा ७२ कि.मि. मानव सङ्गलो



**बिध्यालय सौचालयमा छात्राहरूका लागी Mensuration Pad Disposal सहीतको व्यवस्था**



## **Institutional Latrine with Hand washing Facility**




## **Depletion of Water sources**







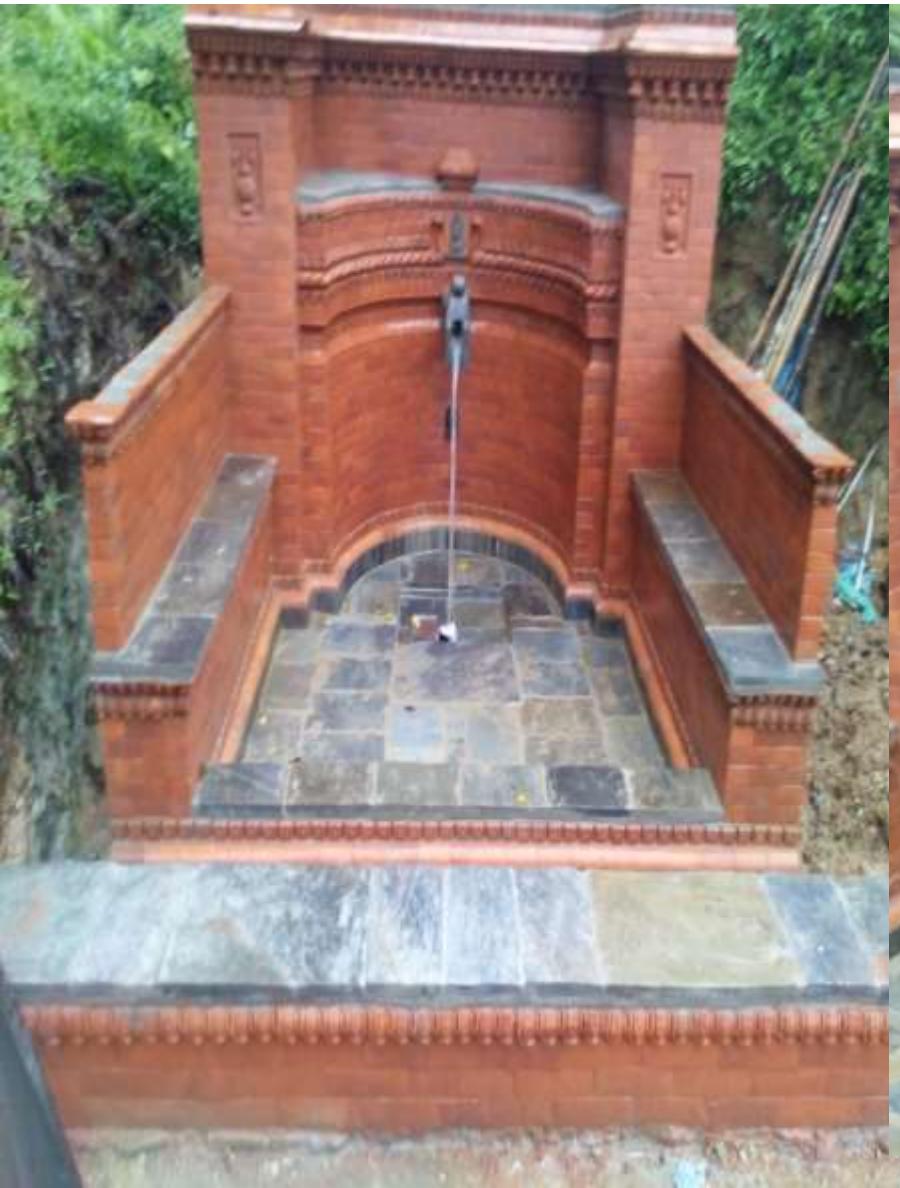

ধৰ্ম্মবাদ
